

市町村名	多良間村
------	------

**令和5年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】**

事業番号・事業名	6-①	たらびん公園整備工事	新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章-2-(2)-イ
担当部署名	多良間村役場 土木建設課	事業実施(予定)年度	令和4年度～令和5年度	沖縄振興基本方針該当箇所
				安全・安心に暮らせる島を目指す
				Ⅲ-4-(2)

**事業内容**  
 住民の健康維持や、安心して子育てができる環境づくりの促進のため、運動スペース、トイレ、遊具、駐車場を備えた公園を整備する。令和4年度は土地整備やトイレ・駐車場の整備、令和5年度は遊具の設置を行う。

**効果発現年度**  
 当年度       後年度( 7 年度)

**実施方法**  
 直接実施       委託       補助       負担       その他( )


		R4年度	R4年度繰越	R5年度	R5年度繰越		
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	(a) 当初予算額	64,959		85,000		
		(b) 予算現額	64,680		84,700		
		(c) 増減額(b-a)	▲279	0	▲300	0	
		(d) 繰越額		38,808		50,820	
		A. 計(b+d)	64,680	38,808	84,700	50,820	0
	B. 執行済額		25,872	38,808	33,880	50,820	
	うち交付金充当額		20,697	31,046	27,104	40,656	
	次年度繰越額		38,808				
	執行率(%) (B/A)		40.0%	100.0%	40.0%	100.0%	#DIV/0!
	予算の状況の説明		当初予算85,000千円で入札により差が生まれた。前年度の事業完了が遅れてしまい、令和5年度の遊具設置工事にも遅れが生じた。				

活動目標(指標)及び達成状況	R5活動目標(指標)	達成状況			
			R4年度	R5年度	R6年度
		整備工事(運動スペース、トイレ、駐車場)	目標	公園整備工事了完了	公園整備工事了完了
		実績	繰越	完了	
	大型アスレチック遊具等の設置	目標	( )	大型アスレチック遊具等の設置	大型アスレチック遊具等の設置 ( )
		実績		繰越	完了
達成状況説明	令和5年度はブランコや滑り台、砂場などの遊具の設置工事を実施、令和4年度整備工事の遅れが影響し繰越となり、令和6年5月に公園整備が完了した。				

成果目標(指標)及び進捗状況	R5成果目標(指標)		基準値(年度)	R4年度	R5年度	R6年度	目標値(R7年度)	
			整備工事(運動スペース、トイレ、駐車場の整備完了)	目標	( ) ( 工事了完了 )	( 工事了完了 )	( )	( )
				実績	/	繰越	完了	/
	大型アスレチック遊具等の設置完了	目標	( ) ( )	( 設置工事了完了 )	( 設置工事了完了 )	( )		
		実績	/		繰越	完了	/	
	公園の整備により「健康促進や子育て環境の向上」に繋がったと感じる村民の割合:80%以上	目標	( ) ( )	( )	( )	( 80% )	( 80% )	
		実績	/			0	/	

進 捗 状 況 説 明	令和4年度に運動スペース、トイレ、駐車場等の整備工事。令和5年度はブランコや滑り台、砂場などの遊具の設置工事が行われた。地元住民との調整や、資材の物価高騰や資材搬入の遅れなどにより不測の日数を要したため、工期延長が発生したが令和6年5月に公園整備が完了した。供用開始後に公園を利用した保護者や近隣学校の指導者などから、日よけの設置、飛び出し防護柵、公園内の使用に関する案内板等と設置が必要との声があがった。安心安全な施設利用のため、指摘箇所の一部を追加設置。飛び出し防護柵の設置や日よけの、公園案内標示板等の設置工事が令和7年3月に完了した。防護柵や案内板設置等の設置工事が発生したため、アンケートへの着手が遅れた。令和7年にアンケート調査を実施する。
----------------------------	--

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	令和4・5年にまたがる事業実施となった。新型コロナによる影響もあり、資材搬入の遅れ、工期内に事業を完了することができず工期延長をすることとなった。	作業員の増員を行い、工期の短縮に努めた。結果、工期に間に合わず繰り越したとなったが、令和6年5月の早い段階で公園整備が完了した。
<b>今後の取り組み方針</b>		
公園整備完了後、アンケートによる実態調査を行い住民の運動、生活習慣病の改善メタボの脱却に繋がる点等、公園整備による効果の程を検証することにあわせ、村民の大多数が健康促進や子育て環境の向上に繋がったと感じているか割合の増加を目指す。		

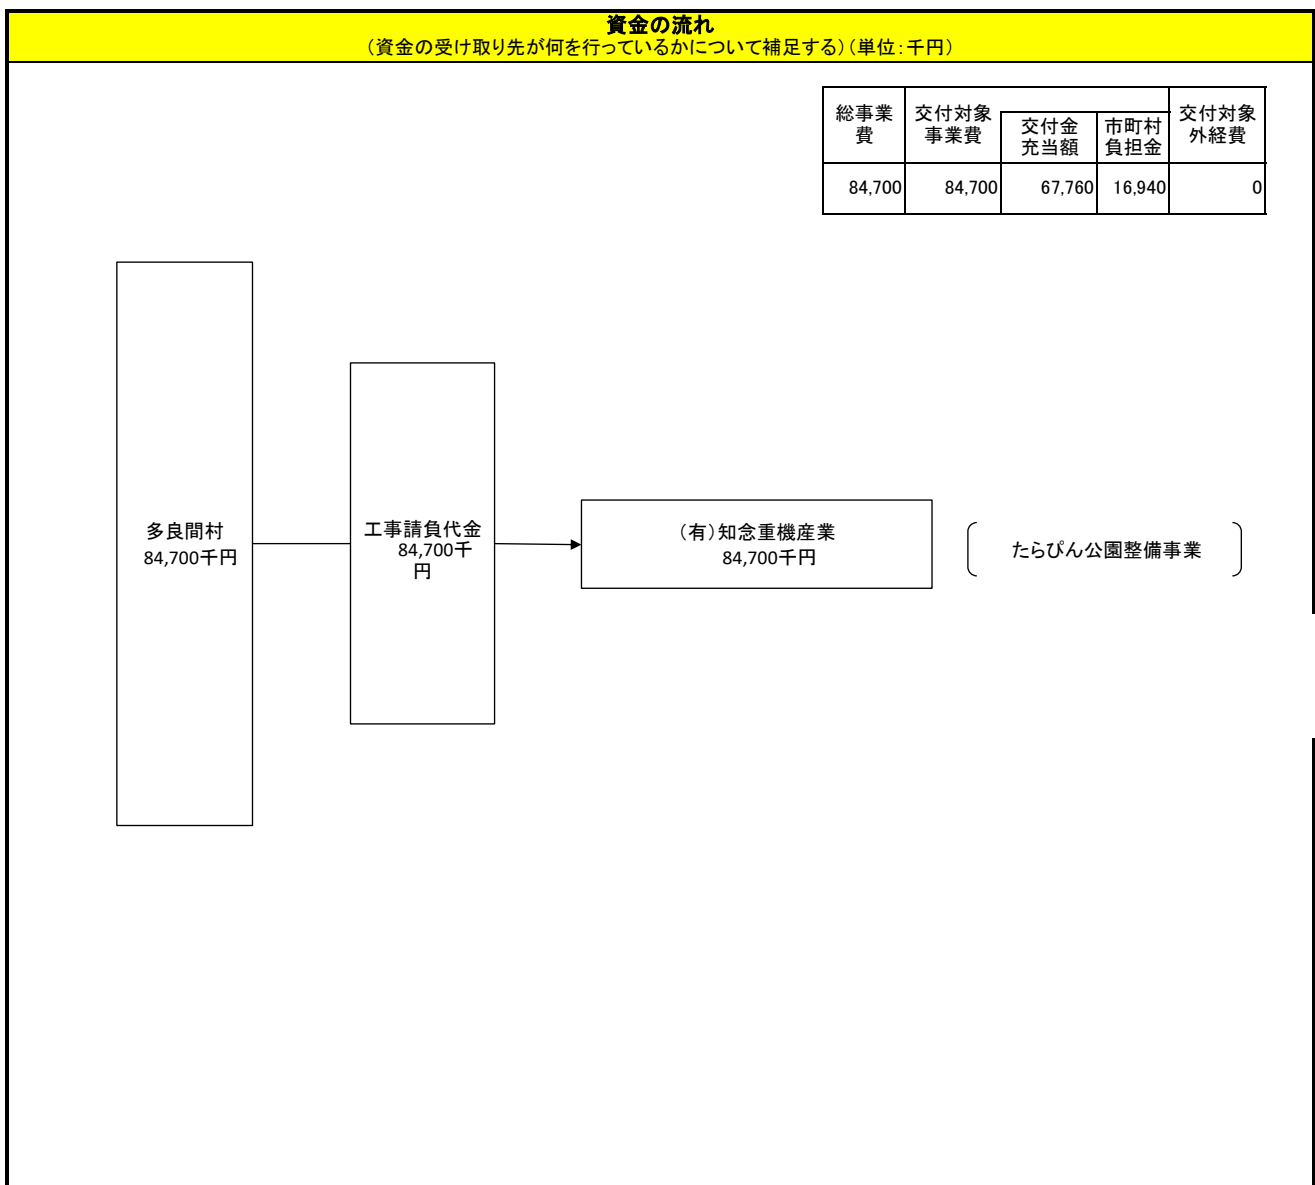

資金の流れ、費目・点検評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○支出先は、工事を請け負った(有)知念重機産業であり事業を円滑に進めることができること、入札により落札した業者であり妥当と考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算現額について、事業内容に見合った執行となっており、適切な予算規模と考える。
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	○指名競争入札により落札された業者であり妥当と考えている。
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○費目・使途については、精算段階で検査を実施しており、目的に対し必要なものであったと判断した。
